


## Beschreibung zum Funktionsheizen einer Fußbodenheizung

Der Aufheizvorgang einer Fußbodenheizung ist eine Funktionsprüfung des Heizungsgewerkes und dient nicht zur erforderlichen Trocknung des Estrichs für die Belegreife!

Dass dabei natürlich der Estrich gleichzeitig getrocknet wird, ist für den weiteren Bauablauf ein positiver Nebeneffekt.

Eine Trocknung zur Belegreife ist jedoch weder vorgesehen, noch gewährleistet. Eine allgemein gültige Schnittstellenkoordination kann kostenlos unter [www.flaechenheizung.de](http://www.flaechenheizung.de) bezogen werden.

Eine CM Messung zur Belegreife oder ein Folientest ist zwingend vor einer Bodenbelagsaufbringung erforderlich.

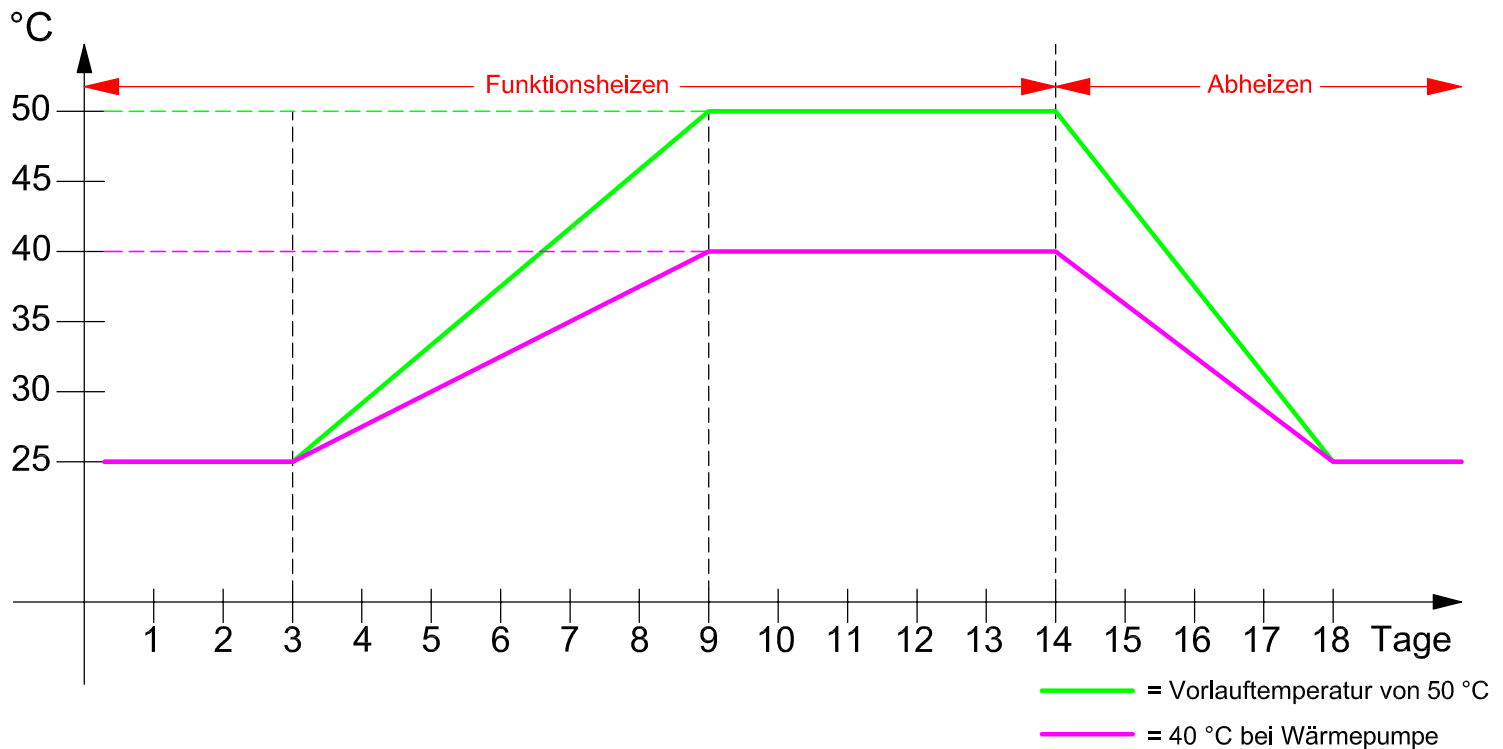

### Funktionsheizvorschrift für Zement-Estriche:

Beginn 21 Tage nach Estricheinbringung laut DIN 4725

- 1. bis 3. Tag** - Vorlauftemperatur auf 25 °C einstellen und 3 Tage halten
- 4. bis 8. Tag** - Vorlauftemperatur täglich um 5 °C erhöhen bis zur vorgesehenen max. Vorlauftemperatur
- 9. bis 14. Tag** - max. Vorlauftemperatur halten (ohne Nachtabenkung)
- ab 14. Tag** - Absenken der Vorlauftemperatur auf 25 °C
